

Oppstartseminar

Hamar 14. juni 2017

Maud Nässén, Kholod Mahmood, Janne Eidissen, Line Helene Nilssen, Stig Skoglund og Erik Hagen




Program

- Kl. 10.15 Åpning v/ Interreg-sekretariatet
- Kl. 10.20 Presentasjon av prosjektene v/ prosjektlederne (Ca 5 minutter per prosjekt)
- Kl. 11.00 Prosjektstyring. v/ Interregsekretariatet
- Kl. 11.30 Kommunikasjonsinnsatser. v/ Interreg-sekretariatet
- Kl. 12:00 Lunsj i kantina

Delt svensk og norsk program (pga ulike rutiner i Sverige og Norge)

- Kl. 12.45 Framdriftsrapportering i regionalforvaltning.no og svensk rapporteringsmodul. Kostnader, utbetaling m.m.
- Kl. 14.45 Felles avslutning - Fylkestingsalen



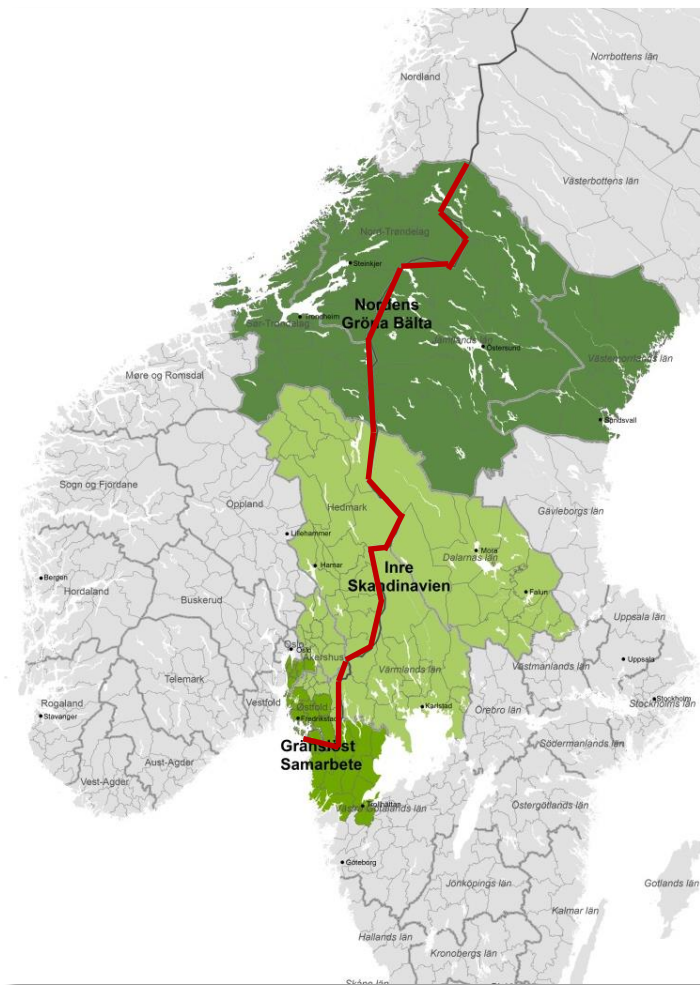

Konsept, utvikling og søknadsfase gjennomført – søknad innvilget!

- Hva nå?

1. Les *tilsagnsbrevet* nøye

2. Returnér *vilkårsbekreftelse* (drøftes med leder)



3. Oppstartseminar – bli kjent med sekretariatene som en partner i prosjektgjennomføringen. Praktiske *rutiner og krav* knyttet rapportering og økonomi

4. Kick-off for prosjektpartene?

5. Inngå evt. avtaler/ kontrakter med partnere (ref. Prosjekthåndboken)



6. *Likviditet*: Alt. søke om a-konto utbetaling av medfinansiering

7. *Offentlige innkjøp* Prosjekthåndboken. NB! «God forretningskikk» gjelder alltid, uansett beløp



8. Bruk prosjektplanen inkl. tids- og aktivitetsplanen

Bilaga nr. 4 Tid- och aktivitetsplan FEM2020 Klimadrevet utvärdering

Projektets start och slutdatum:

Start	
Slut	
Antal projekt dagar (max 300 dagar)	460



Beskriv huvudaktiviteten och markera tidsperioden den varar
Beskriv aktiviteten och markera tidsperioden som aktiviteten varar

År	Text	2013												2014											
		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Huvudaktivitet 1	KK: Møteplan for klimadrevet utvärdering																								
Aktivitet 1.1	Kontakta berörda av ereralliseringsmetodikk for grøn næringsutvikling																								
Aktivitet 1.2	Eneralliseringsplaner 2-4 per år i hver region																								
Aktivitet 1.3	Viderutvikle felles eneralliseringskonsept for alle fire regioner																								
Aktivitet 1.4	Videreføre nettkapasitet innen smarte tids																								
Aktivitet 1.5	Etablere en felles halvårlig solPV møteplass																								
Aktivitet 1.6	Etablere og lansere samarbeidsforhold mellom fire energipolitiske nettverk																								
Aktivitet 1.7	Kontaktpalettering av energiparkene																								
Aktivitet 1.8	Etablere en styrings fordeling mellom helsekole, FOU, videregående																								
Aktivitet 1.9	Etablere av grensarbeidende FOU-prosjekt																								
Huvudaktivitet 2	KK: Analyse og tilknyttet med tilsvarende 2014-20																								
Aktivitet 2.1	Etablere av videregående fortrinnsprosjekt																								
Aktivitet 2.2	Utvikling Energiforskningsprosjekt i andre tolv																								
Aktivitet 2.3	Intern workshop for medlems for å komme fram til felles mål og																								
Aktivitet 2.4	Møte i samarbeid med ledende fagpersoner i IS for forskning																								
Aktivitet 2.5	Workshop for å etablere Foretaksprosjekt																								
Aktivitet 2.6	Debatte på regionale og internasjonale møter																								
Huvudaktivitet 3	KK: Kommunikasjon og profilering																								
Aktivitet 3.1	Fremme ut- og opprettholde av utvikling																								
Aktivitet 3.2	Styrt på regionale og internasjonale møter																								
Aktivitet 3.3	Sett FEM - etablere et innlegg																								
Aktivitet 3.4	Markedsundersøkelse av Energiplan																								
Huvudaktivitet 4	Administrasjon																								
Aktivitet 4.1	Planlegging og oppfølging av aktiviteter																								
Aktivitet 4.2	Arbeid med prosjektarbeid																								
Aktivitet 4.3	Økonomistyring																								
Aktivitet 4.4	Møte i styringsgruppen																								
Aktivitet 4.5	Møte i prosjektgruppen																								
Aktivitet 4.6	Rapportering i form av fagrapporter																								
Aktivitet 4.7	Rapportering i form av statusrapport og samlede data og statistikk																								




9. Meld fra til sekretariatene om *avvik* –
framdrift eller økonomi mv.

10. Reis. Se. Lær.



Svensk-norsk samarbeid

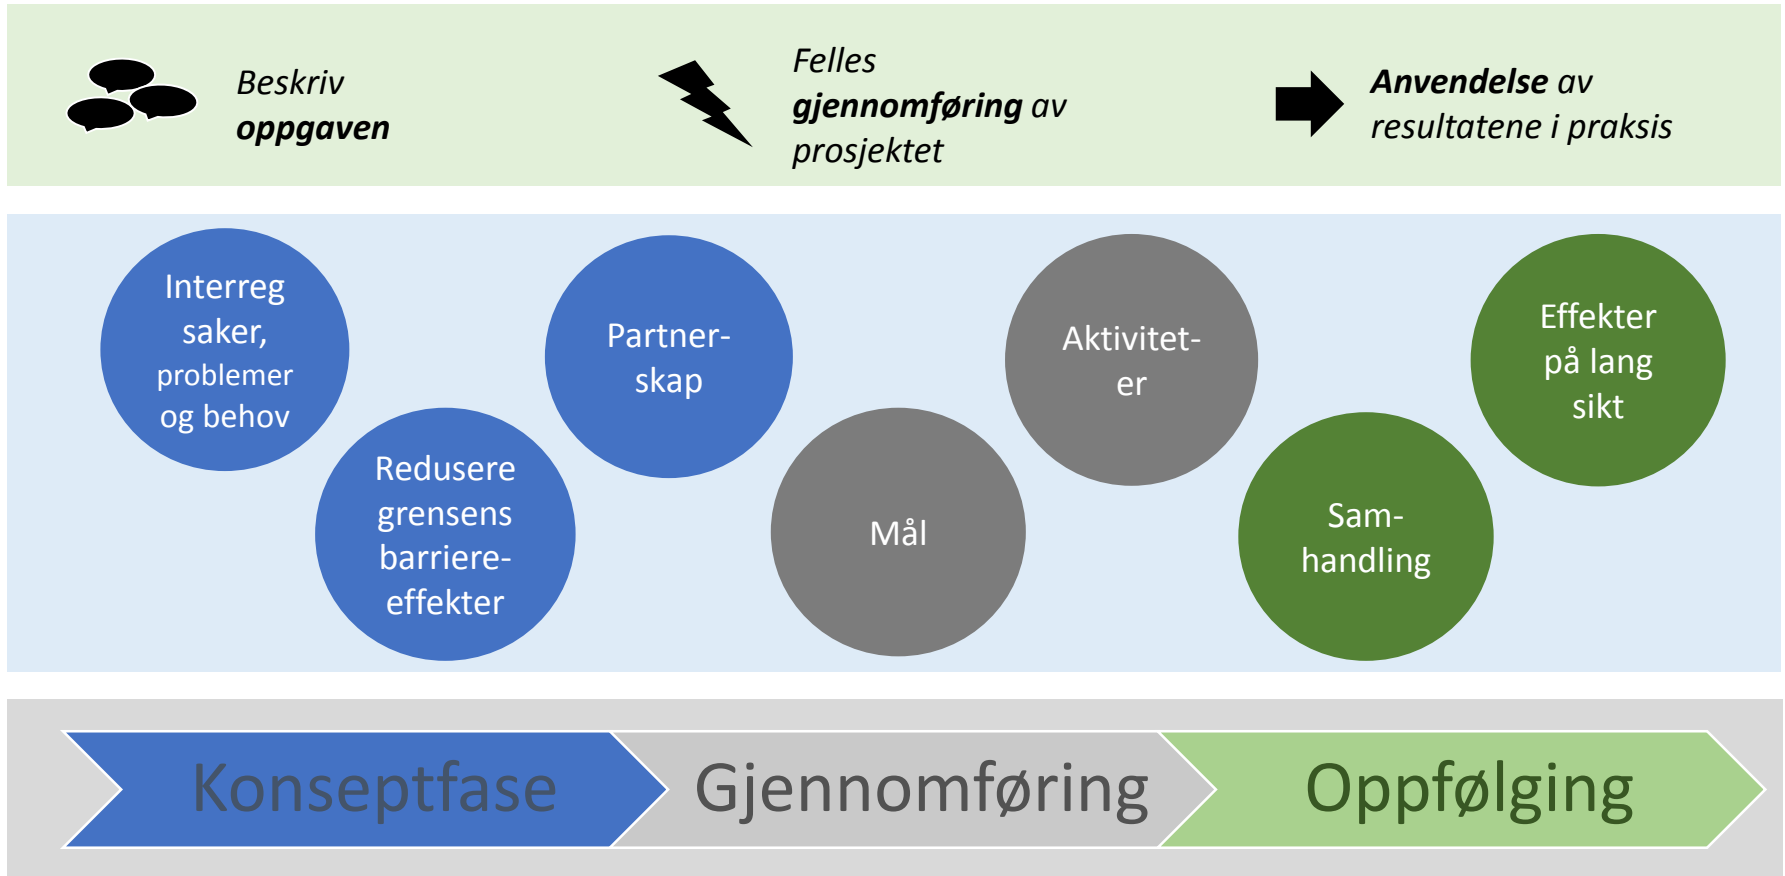

Flytskjema prosjekt. Kilde: ESPON

Noen erfaringer

- Tillit mellom partene bygges i et langsiktig samarbeid
- God organisering og arbeidsfordeling
- Se arbeidet i en større sammenheng
- Viktig med regional forankring
 - Hold kontakt med fylker, regioner og kommuner
- Dialog med sekretariatene
 - Rutiner, fleksibilitet og støtte

”Sekretariatet ska... bistå stödmottagare vid genomförandet av insatserna.”



Läges- och slutrapport

Läges- och slutrapporter ska alltid vara gemensam/felles

- Verksamhetsmål och resultat
- Periodens verksamheter och kostnader
- Tid- och aktivitetsplan
- Indikatorer
- Informationsinsatser och skyltning av projektet
- Dokument som styrker deltagande, inbjudningar etc.
- Frågor eller förändringar av projektet
- Ändringar kan även anmälas i lägesrapporten.



Lykke til!

